




REGIONE CAMPANIA

PNRR

- Esami e buone pratiche regionali
- Avanzamento della spesa: ottimizzazione risorse e soggetti attuatori

Ing. Roberta Santaniello
Dirigente Attuazione M6-Edilizia Sanitaria
Regione Campania



La localizzazione delle Centrali Operative Territoriali – CoT


In sede di sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti, la Regione Campania stabilisce un target minimo regionale pari a **n. 58 COT** e un target massimo regionale pari a **n.65 COT**.

Successivamente, in fase di programmazione, il target massimo regionale è stato aumentato a **n.87 COT**; tale variazione è attualmente in fase di conferma.

REGIONE CAMPANIA	TARGET MINIMO REGIONE - CIS	Target da CIS 2022 al 30/09	TARGET MASSIMO PROGRAMMATO 2024 REGIONE	COT CONCLUSE AL 30/09/2024
	58	65	87	59

Di seguito si riporta la georeferenziazione delle Centrali Operative Territoriali distinte per le 7 ASL:

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI	
• ASL AVELLINO	6
• ASL BENEVENTO	7
• ASL CASERTA	11
• ASL NAPOLI 1	11
• ASL NAPOLI 2	11
• ASL NAPOLI 3	15
• ASL SALERNO	26
TOTALE	87

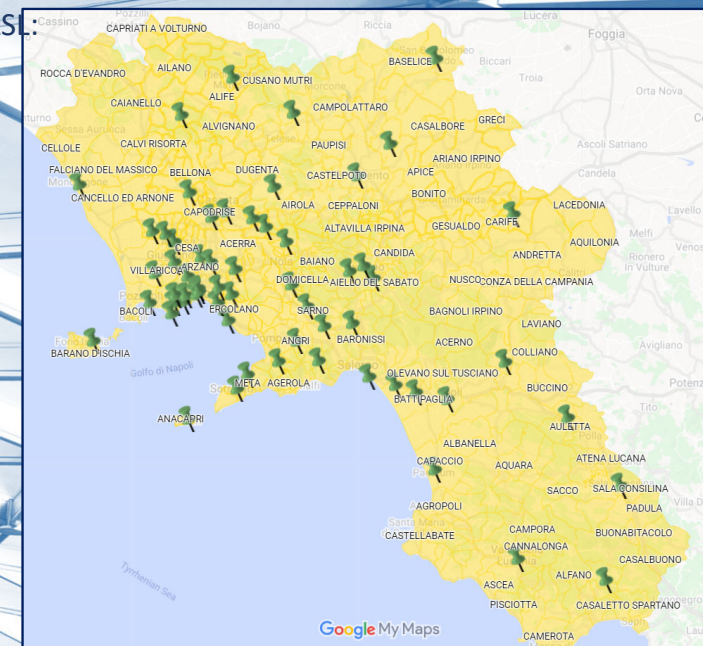

Fonti di finanziamento Centrali Operative Territoriali – CoT


In relazione alle n. 87 CoT, si registra un finanziamento a valore sul PNRR, pari a ca. 10 mln €; tuttavia, con la copertura di altre fonti di finanziamento, il totale valore dei progetti ha superato i 19 mln €.

Di seguito si riporta il dettaglio degli importi, distinti per provincia e per i rispettivi interventi relativi alle Centrali Operative Territoriali.

Descrizione Provincia	Numero Interventi	Somma Finanziamento PNRR	Totale Valore Progetti
AVELLINO	6	518.280 €	710.560 €
BENEVENTO	7	686.635 €	1.578.622 €
CASERTA	11	1.730.750 €	2.485.991 €
NAPOLI	37	5.017.250 €	9.141.128 €
SALERNO	26	2.076.900 €	5.226.996 €
Totale	87	10.029.815 €	19.143.296 €


PNRR

I 10 mln € a valore sul PNRR, rappresentano il 52% del totale delle fonti utilizzate per la realizzazione delle CoT, come di seguito riportato:

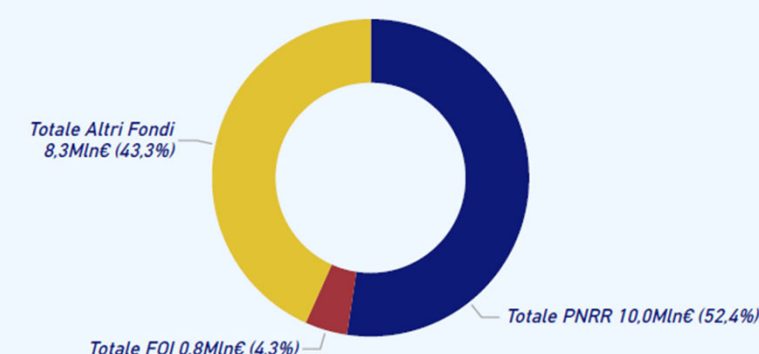


ULTERIORI FONTI

I 19 mln € relativi al totale del valore degli interventi, sono raggiunti mediante la copertura delle seguenti fonti di finanziamento ulteriori, come di seguito riportato:

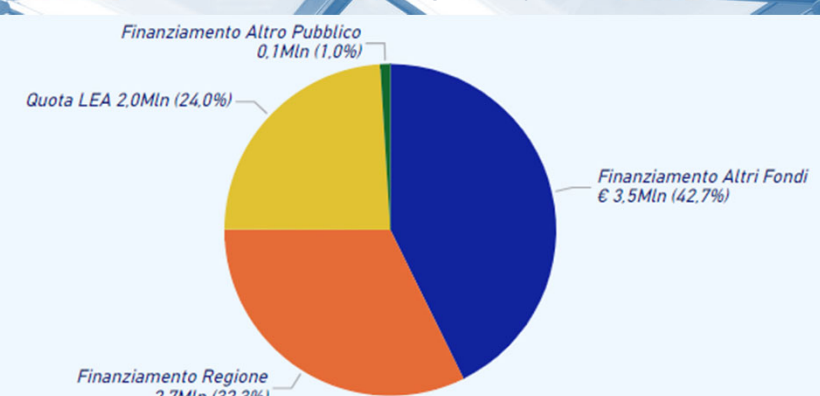

Stato di avanzamento Centrali Operative Territoriali – CoT

Al 30.09.2024, la Regione Campania ha raggiunto il target regionale relativo alla rendicontazione di **n.59 CoT** per un valore complessivo di **848,84 mila €** rendicontati.

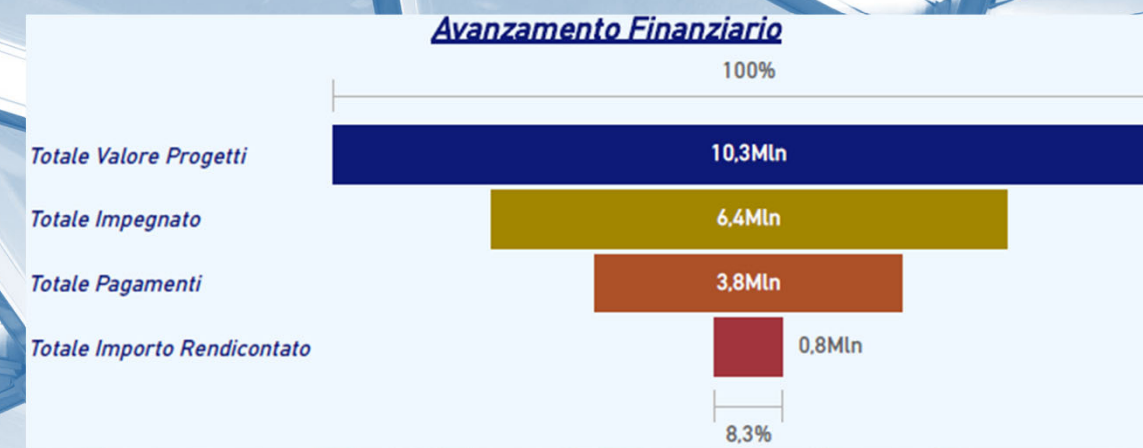

Avanzamento progettuale

In considerazione del raggiungimento del target di 59 CoT, pari a ca. 10 mln € residuano quindi n. 28 CoT pari a ca. 8.9 mln € che dovranno essere alimentate le **14 fasi di iter di progetto sul S.I. Regis**. Si riporta di seguito lo stato di avanzamento progettuale, distinto per Ente, in relazione alle fasi da alimentare su Regis






Stato di attuazione Regione Campania

A livello generale, la Regione Campania si configura quale Soggetto Attuatore di n.922 interventi, pari a 2.176.518.741 €, distribuiti come segue sull'intero territorio regionale:

Gli interventi, inoltre, sono distinti per le seguenti linee di investimento con il relativo valore totale dei progetti:

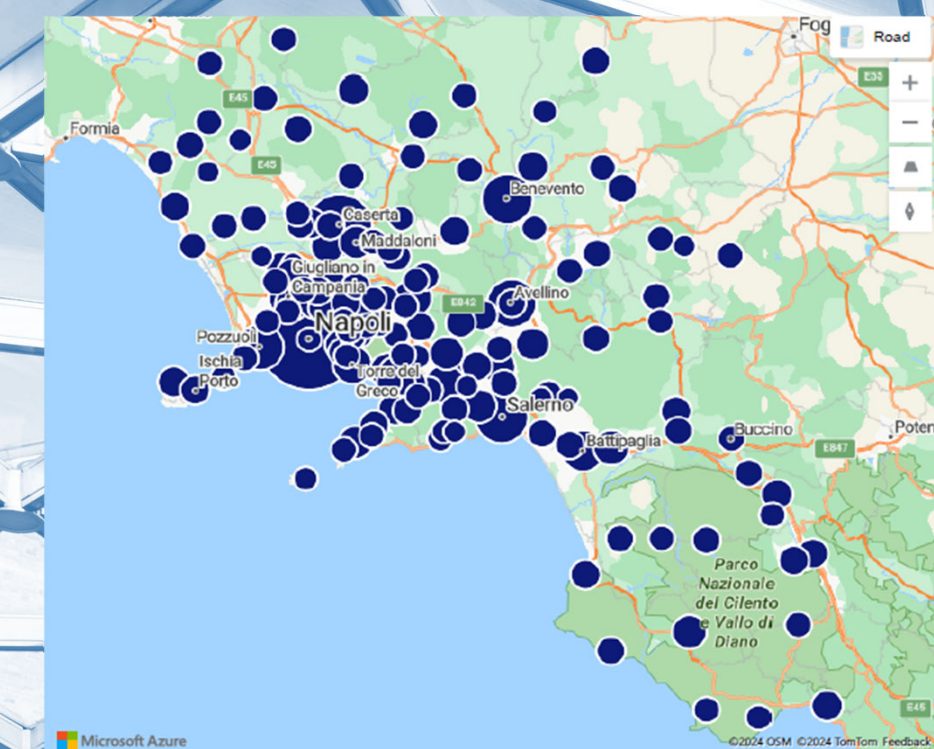

MISURA	Numero Interventi	Totale Valore Progetti
M&C1.1.1 - CdC	172	353.209.397 €
M&C1.1.2 - CoT	87	19.143.296 €
M&C1.1.2 - CoT (Device)	7	5.609.532 €
M&C1.1.2 - CoT (interconnessione)	1	4.122.145 €
M&C1.1.2.1 - ADI	1	475.035.428 €
M&C1.1.2.3 - Telemedicina	1	46.690.321 €
M&C1.1.3 - OdC	48	162.239.887 €
M&C2.1.1 - (Grandi Apparecchiature)	407	133.127.156 €
M&C2.1.1 - DL 34/2020	78	187.652.746 €
M&C2.1.1 - Digitalizzazione DEA	29	160.943.644 €
M&C2.1.2 - (ospedale sicuro ex art.20. L. 67/1988)	49	260.661.310 €
M&C2.1.2 - Verso un Ospedale sicuro (PNC)	11	171.741.244 €
M&C2.1.2 (Ospedale Sicuro)-PNRR	9	85.438.914 €
M&C2.1.3.1 - FSE	2	68.726.136 €
M&C2.1.3.1 - SDK	4	3.300.000 €
M&C2.2.2.A - formazione di medicina generale	2	21.376.564 €
M&C2.2.2.B - formazione in infezioni ospedaliere	16	7.171.271 €
M&C2.2.2.C - formazione manageriale	2	10.329.750 €
Totale	926	2.176.518.741 €

Fonti di finanziamento M6


In relazione ai n.926 interventi presenti sulle province del territorio (di cui n.4 a titolarità della Regione Campania), si registra un finanziamento a valore sul PNRR, pari a ca. 1.663 mld € (di cui 1.276 mld distribuiti sulle province); tuttavia, con la copertura di altre fonti di finanziamento, il totale valore dei progetti raggiunge 2.176 mld € (di cui 1.628 mld distribuiti sulle province).

Di seguito si riporta il dettaglio degli importi, distinti per provincia e per i rispettivi interventi complessivi.

Descrizione e Provincia	Numero Interventi	Somma Finanziamento PNRR	Totale Valore Progetti
AVELLINO	68	89.702.232 €	114.662.070 €
BENEVENTO	61	69.128.196 €	101.602.039 €
CASERTA	130	207.662.708 €	254.759.940 €
NAPOLI	446	643.890.622 €	809.855.850 €
SALERNO	217	266.276.153 €	347.755.134 €
Totale	922	1.276.659.911 €	1.628.635.032 €


PNRR

1.663 mld € a valore sul PNRR, rappresentano il 76,4% del totale delle fonti utilizzate per la realizzazione degli interventi, come di seguito riportato:

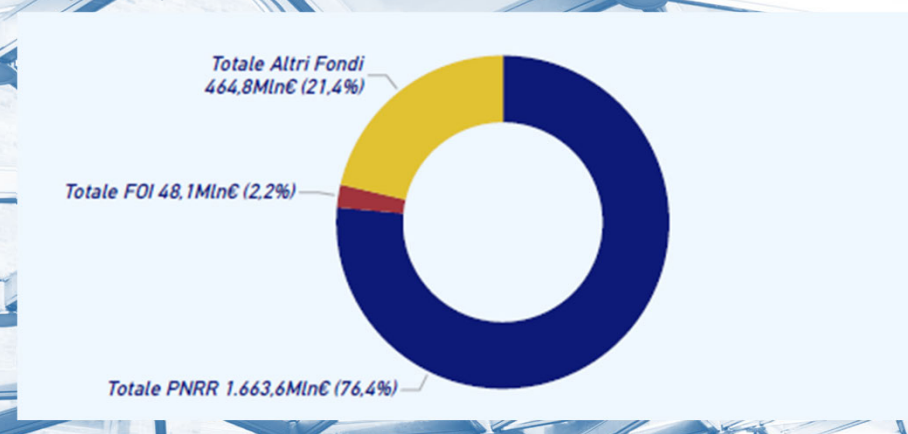

ULTERIORI FONTI

2.176 mld € relativi al totale del valore degli interventi, sono raggiunti mediante la copertura delle seguenti fonti di finanziamento ulteriori, come di seguito riportato:

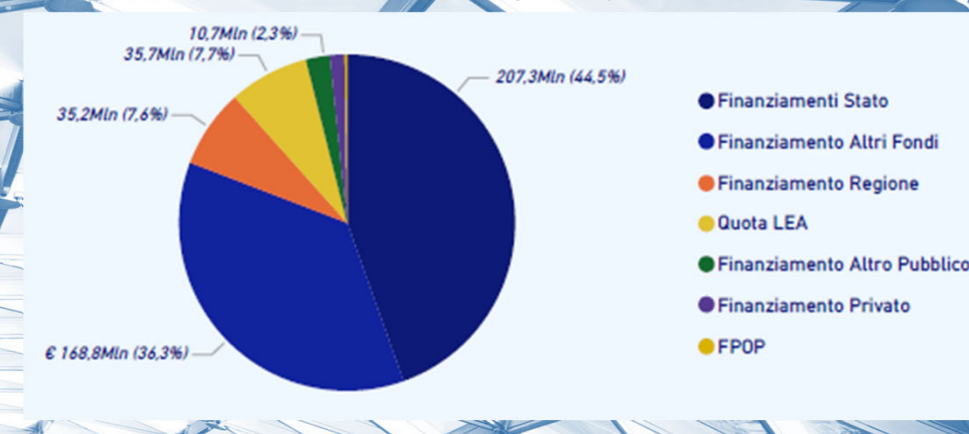


Stato di avanzamento interventi

In considerazione dei n.926 interventi totali per cui la Regione Campania si configura quale Soggetto Attuatore, emerge il seguente stato di avanzamento finanziario:



A fronte di un valore totale del finanziamento pari ad oltre 2 mld €, la Regione Campania ha rendicontato 6.38 mln €, pari a ca. 0,4% del totale.

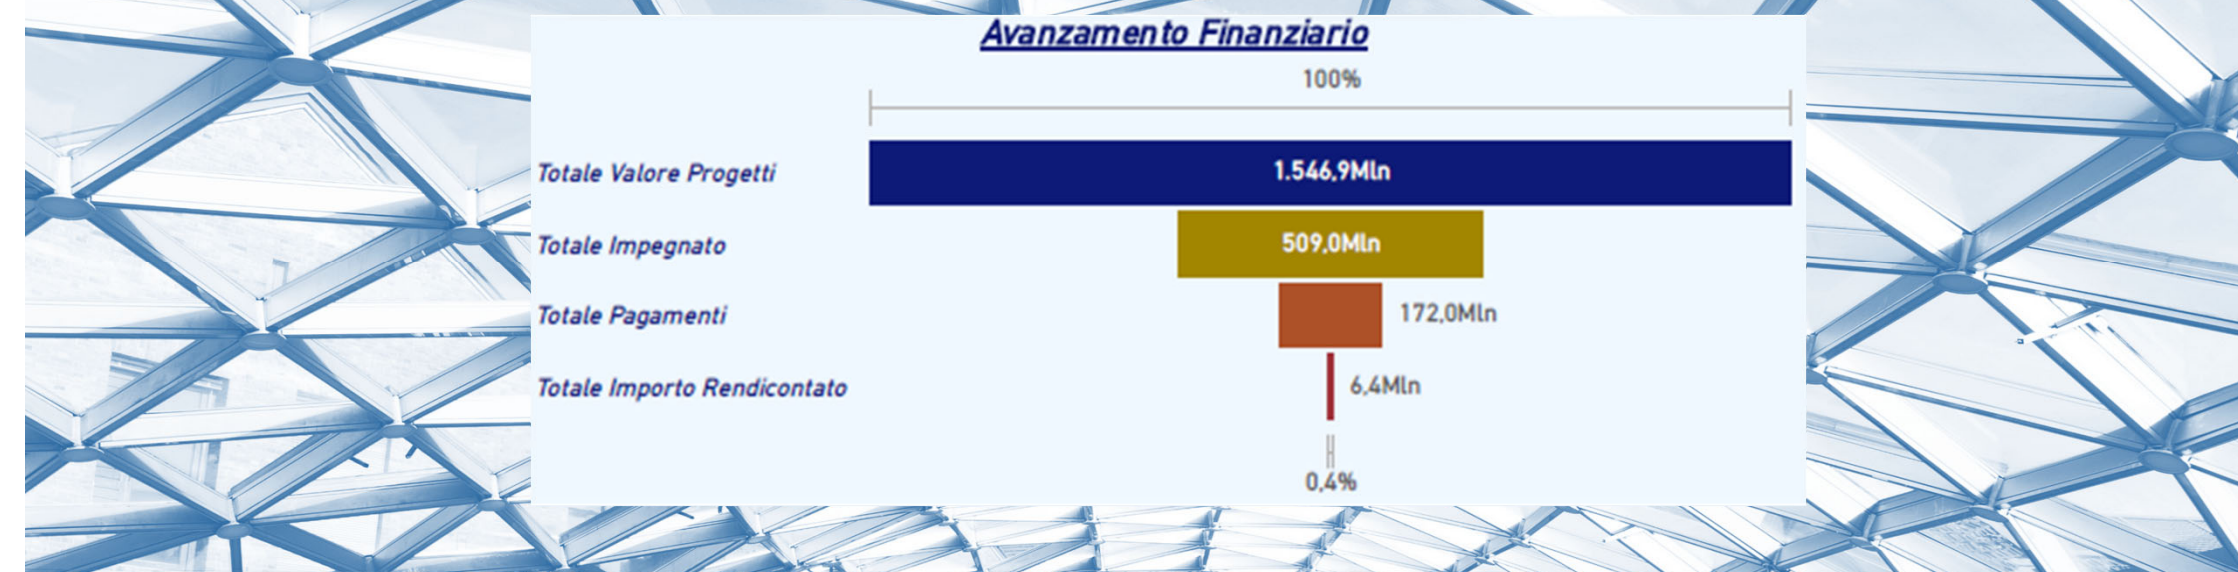



Principali criticità

Tra le principali criticità riscontrate dalle AA.SS, si riscontrano:


- ❖ La maggior parte degli interventi sono in **modifica CIS** ciò determina l'impossibilità a procedere con gli adempimenti richiesti per le verifiche effettuate sulle procedure di gara (es. Dichiarazione assenza doppio finanziamento, nella quale è richiesto l'importo totale del progetto e le rispettive fonti di finanziamento);
- ❖ Le istanze delle aziende sono continue e ovviamente particolarmente onerose di documentazione. Si parla di una media di 30 documenti per fascicolo, quindi fino a 4000 documenti da produrre.
- ❖ **Carenza di personale** adatto alla rendicontazione degli interventi; Carenza del personale preparato alla attività.
- ❖ **Gare Consip non ancora espletate**, in attesa della sentenza del Consiglio di Stato; questo non consente di avere certezza sulla conclusione dell'intervento .
- ❖ Alcune **gare Consip sono state riaperte solo da pochi giorni**, ciò comporterà un automatico e fisiologico ritardo su tutta la procedura (acquisizione dell'apparecchiature, installazione e collaudo e quindi rendicontazione della stessa);
- ❖ Percorre un lasso di tempo non breve **tra l'invio del rendiconto di progetto al Ministero e il successivo riscontro**. Ciò rallenta la procedura di rendicontazione e di successivo rimborso;
- ❖ Un ulteriore aggravio del processo è dato dall'**elaborazione della richiesta di rimborso** per cui sarebbe opportuno che il rimborso e la rendicontazione fossero eseguiti nella medesima fase.
- ❖ Progetti in essere ci sono difficoltà nella riconducibilità degli interventi alla rendicontazione PNRR.
- ❖ Interventi Ospedale sicuro, la piena attuazione è legata alla necessità di realizzazione degli interventi di adeguamento sismico su strutture sanitarie esistenti e operative che comportano un ritardo nella realizzazione degli investimenti.
- ❖ Riconnessione delle modalità di rendicontazione PNRR e PNC ad un unico modello organizzativo.

Quadro previsionale

Nonostante le criticità rilevate, sono state intraprese numerose attività di supporto ai RUP nella fase di rendicontazione degli interventi. In virtù di ciò, si illustra di seguito una previsione del dato di rendiconto al 31.12.2024:

MISURA	Numero di CUP rendicontati	Totale importo rendicontato	Numero di CUP rendicontabili	Totale importo rendicontabile
M6.C1.1.2 - CoT	9	848.835,08 €	7	941.501,13 €
M6.C2.1.1 - (Grandi Apparecchiature)	14	2.401.535,88 €	19	2.536.855,45 €
M6.C2.1.1 - Digitalizzazione DEA	3	2.527.230,14 €	3	5.584.008,18 €
M6.C2.1.2 (Ospedale Sicuro)-PNRR	2	604.606,96 €	2	3.239.962,43 €
Totale	28	6.382.208,06 €	31	12.302.326,89 €

NEXT STEPS

CDC	COT	ODC	OS	GA	DEA
<ul style="list-style-type: none"> Proseguimento del supporto attuativo per la corretta alimentazione del S.I. Regis ai fini della successiva rendicontazione 	<ul style="list-style-type: none"> Raggiungimento target  CUP da target in fase di rendicontazione 	<ul style="list-style-type: none"> Proseguimento del supporto attuativo per la corretta alimentazione del S.I. Regis ai fini della successiva rendicontazione 	<ul style="list-style-type: none"> Proseguimento del supporto attuativo per la corretta alimentazione del S.I. Regis ai fini della successiva rendicontazione 	<ul style="list-style-type: none"> Previsione di n.238.GA concluse per il raggiungimento del target al 31.12 	<ul style="list-style-type: none"> Proseguimento del supporto attuativo per la corretta alimentazione del S.I. Regis ai fini della successiva rendicontazione
