



Forum Risk Management

obiettivo sanità & salute

26-29 NOVEMBRE 2024
AREZZO FIERE E CONGRESSI

19

INTERVENTI AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Ing. Riccardo Antonelli

28 NOVEMBRE 2024

ITALIA DOMANI – Missione 6 Salute

- **Riforma 1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima**
 - **Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)**
Assistenza sanitaria il più possibile personalizzata sulla base delle esigenze del paziente e delle loro famiglie, grazie alla **creazione degli Ospedali di Comunità dedicati ai pazienti con patologie lievi o recidive croniche** situati uniformemente su tutto il territorio nazionale
 - **Case della comunità e presa in carico della persona**
Assistenza sanitaria di prossimità ai residenti, assicurando il servizio principalmente alla popolazione più anziana, riducendo così il numero delle ospedalizzazioni anche non urgenti.
 - **Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina**
Assistenza delle persone affette da patologie croniche, con particolare attenzione verso gli over 65

ITALIA DOMANI

Totale destinato alla Missione: € 15,63 mld

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 - Approvazione del Piano finanziario 2022-2026 delle risorse assegnate alla Regione Toscana e presa d’atto dello Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e del Piano Operativo Regionale (POR)”

Totale destinato alla USL TSE: € 100 mln

Totale importo lavori USL TSE: € 68 mln

Totale importo grandi apparecchiature USL TSE: € 14 mln

Importo lavori

- 6 ospedali di comunità € 9.762.670,84
- 19 case di comunità € 31.699.708,92
- 8 centrali operative territoriali € 1.344.374,43
- 5 ospedali sicuri € 24.696.004,46

• MILESTONE T1 2023

Raggiungimento della Milestone del 31.03.2023 con tutti gli obiettivi individuati dal CIS/POR della Regione Toscana, in relazione alle linee di investimento interessate, nello specifico:

- sono stati adottati gli atti di validazione per tutti i progetti relativi alle Case di Comunità e agli Ospedali di Comunità;
- sono stati assegnati i codici CIG per la realizzazione delle opere strutturali.

• MILESTONE T3 2023

Raggiungimento della Milestone del 30.09.2023 con tutti gli obiettivi individuati dal CIS/POR della Regione Toscana, in relazione alle linee di investimento interessate, nello specifico:

- sono stati stipulati i contratti per la realizzazione delle Case di Comunità;
- sono state stipulate le obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità.

• TARGET T1 2024

Centrali operative pienamente funzionanti

• TARGET T4 2024

Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie



Forum Risk Management

obiettivo sanità & salute

26-29 NOVEMBRE 2024
AREZZO FIERE E CONGRESSI

19

INTERVENTI AREA PROV.LE GROSSETANA

Ing. Riccardo Antonelli

28 NOVEMBRE 2024



OdC Area Grossetana – Villa Pizzetti

DZD Dr.ssa Tania Barbi

Finanziamento 2.742.370 € - FONDI PNRR


RUP – Ing. Riccardo Antonelli

Intervento previsto: ristrutturazione piano primo ex RSA di Villa Pizzetti

Stato dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico rafforzato;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato, approvato e validato progetto esecutivo;
- Consegna lavori avvenuta in data 15 luglio 2024.

Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est

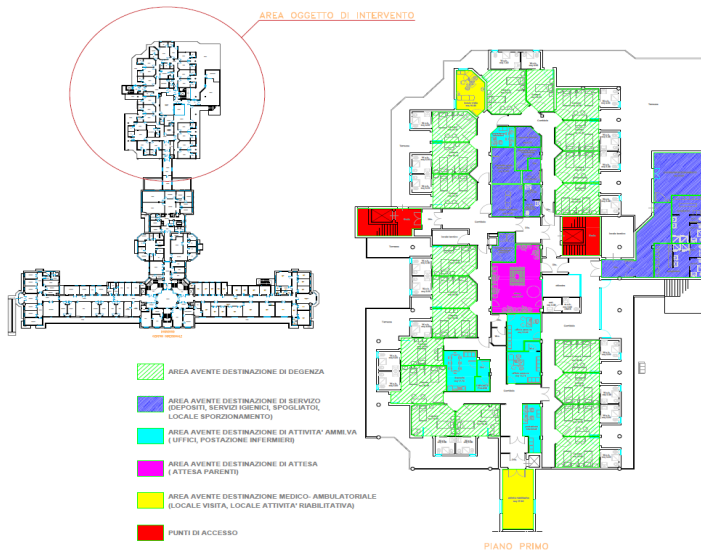



CdC HUB 1 Grosseto – Villa Pizzetti

DZD Dr.ssa Tania Barbi

Finanziamento 1.508.780€ - FONDI PNRR


RUP – Ing. Riccardo Antonelli

Intervento previsto: ristrutturazione piano primo

Stato dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico rafforzato;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato, approvato e validato progetto esecutivo;
- Consegna lavori avvenuta in data 5 settembre 2024.

Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est

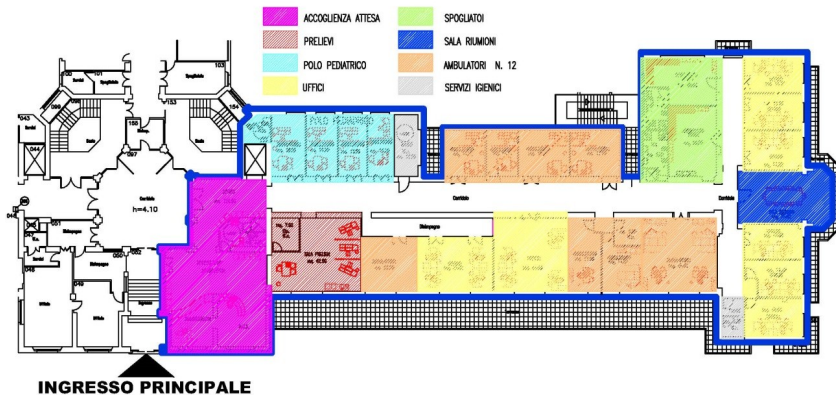



CdC HUB 2 Grosseto – via Don Minzoni DZD Dr.ssa Tania Barbi

Finanziamento 1.731.100€ - FONDI PNRR
RUP – Geom. Fabrizio Gabbrielli

Intervento previsto: ristrutturazione piano rialzato e piano primo

Stato dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto Definitivo;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato, approvato e validato progetto esecutivo;
- Consegna lavori avvenuta in data 27 marzo 2024.

Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est



CdC HUB Colline Metallifere - Follonica

DZD Dr.ssa Tania Barbi


Finanziamento 1.538.780€ - FONDI PNRR
RUP – Ing. Riccardo Antonelli

Intervento previsto: ristrutturazione piano terra con ampliamento

Stato dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto Definitivo;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato, approvato e validato progetto esecutivo;
- Consegna lavori avvenuta in data 17 giugno 2024.

Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est

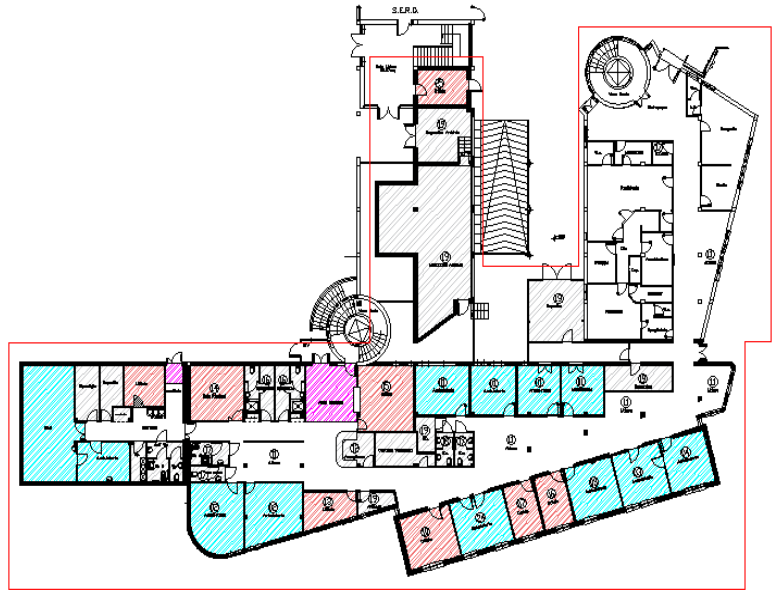



CdC HUB Amiata Grossetana – Castel del Piano

DZD Dr.ssa Tania Barbi

Finanziamento 1.637.660€ - FONDI PNRR
RUP – Ing. Federica Baccheschi

Intervento previsto: ristrutturazione piano terra Ospedale, piano primo Centro Diurno ed ampliamento.

Stato dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto Definitivo;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato, approvato e validato progetto esecutivo;
- Consegna lavori avvenuta in data 1 luglio 2024

Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est





COT Area Grossetana – Villa Pizzetti

DZD Dr.ssa Tania Barbi

Finanziamento 173.075 € - FONDI PNRR
RUP – Ing. Luciano Di Prima

Intervento previsto: ristrutturazione locali presenti all'interno del Centro Direzionale di Villa Pizzetti

Stato dell'arte:

- Lavori conclusi ed arredi consegnati;
- Attivazione effettuata in data 1 marzo 2024

Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est



Adeguamento sismico S.O. Massa Marittima DMPO Dr. Michele Dentamaro

Finanziamento 6.471.241 € - FONDI PNC
RUP – Ing. Riccardo Antonelli

Intervento previsto: miglioramento sismico del Presidio Ospedaliero a seguito di valutazione di vulnerabilità sismica.



Stato dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico rafforzato;
- Nel mese di dicembre 2023 è stato approvato e validato il Progetto esecutivo – lotto 1;
- In data 28 dicembre 2023 si è proceduto con la consegna dei lavori e l'apertura del cantiere – lotto 1;
- In data 19 settembre 2024 si è proceduto con la consegna dei lavori e l'apertura del cantiere – lotto 2.



Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est



OdC Area Colline dell'Albegna - Pitigliano

DZD Dr.ssa Roberta Caldesi

Finanziamento 2.718.640 € - FONDI PNRR


RUP – Ing. Riccardo Antonelli

Intervento previsto: ristrutturazione piano primo del PO Petruccioli

Storia dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico rafforzato;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato, approvato e validato progetto esecutivo;
- Consegna lavori avvenuta in data 21 giugno 2024.

Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est

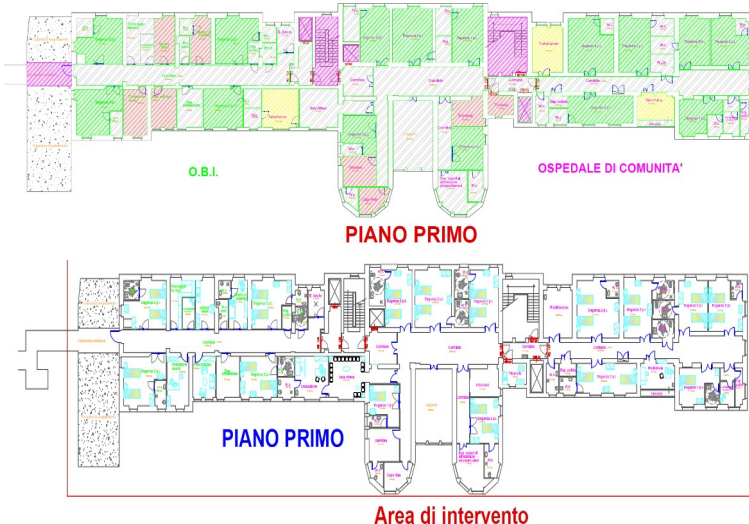

CdC Hub 1 Colline dell'Albegna - Pitigliano

DZD Dr.ssa Roberta Caldesi

Finanziamento 1.750.616 € - FONDI PNRR
RUP – Ing. Riccardo Antonelli

Intervento previsto: nuova costruzione per la realizzazione della CdC

Stato dell'arte:

- Nel mese di marzo 2023 è stato approvato e validato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico rafforzato;
- Allo stato attuale è stato affidato e firmato il contratto per l'appalto integrato, approvato e validato progetto esecutivo;
- Consegna lavori avvenuta in data 3 luglio 2024.

Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est





CdC Hub 2 Colline dell'Albegna - Porto S. Stefano

DZD Dr.ssa Roberta Caldesi

Finanziamento 1.624.843 € - FONDI PNRR
RUP – Per. Ind. Massimo Guidati

Intervento previsto: ristrutturazione completa del fabbricato ottenuto in permuta dal Comune di Monte Argentario per la realizzazione della CdC

Stato dell'arte:

- Consegnato, approvato e validato il progetto esecutivo;
- Consegna lavori avvenuta in data 11 marzo 2024.

Proprietà: Azienda USL Toscana Sud Est





COT Colline dell'Albegna – Ospedale di Orbetello

DMPO Dr. Massimo Forti

Finanziamento 173.075€ - FONDI PNRR
RUP – Ing. Luciano Di Prima

Intervento previsto: ristrutturazione locali interni all'Ospedale di Orbetello per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale

Stato dell'arte:

- Lavori conclusi;
- Prossima attivazione.

Proprietà: INAIL

